



## DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION



Plan Climat Air Energie Territorial

En coopération avec



## MAITRISE D'OUVRAGE :

---



### REDON AGGLOMERATION

3, rue Charles Sillard  
35 600 REDON

Amélie ARLES

Responsable du Pôle Transition  
Écologique et Centralités

@ a.arles@redon-agglomeration.bzh

## ASSISTANT À MAITRISE D'OUVRAGE :

---



### ALTEREA SIEGE ET AGENCE OUEST

11B rue des Marchandises  
44263 Nantes Cedex 2

Lucille LE GALL

Cheffe de projet

@ llegal@alterea.fr

Baptiste DECORPS

Chargé d'études

@ bdecorps@alterea.fr

## TABLE DES MATIERES

<b>1</b>	<b>PREAMBULE</b>	<b>3</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>LE SUIVI DES ACTIONS DU PCAET</b>	<b>3</b>
<hr/>		

# 1 PREAMBULE

D'après le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial, le dispositif de suivi et d'évaluation du PCAET « porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public ».

Le suivi doit donc se dérouler tout au long de la mise en œuvre du PCAET afin de suivre l'état d'avancement des actions et les résultats obtenus et ainsi pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs fixés. Ainsi, à chaque action incluse dans le programme d'actions sont associés un ou plusieurs indicateurs de suivi.

## 2 LE SUIVI DES ACTIONS DU PCAET

### 2.1. Le dispositif de suivi environnemental

Le dispositif de suivi environnemental a pour objectif de surveiller l'évolution des impacts (positifs et/ou négatifs) du PCAET. Le dispositif de suivi environnemental consiste en l'ensemble des moyens d'analyse et des mesures nécessaires au contrôle de la mise en œuvre de l'action. Il permet de vérifier le respect des engagements pris dans le domaine de l'environnement, par une confrontation d'un bilan aux engagements initiaux. Il s'appuie ainsi sur des indicateurs environnementaux, qui permettent d'évaluer les effets du PCAET sur les différents enjeux environnementaux identifiés lors de l'analyse de l'état initial de l'environnement. La présente partie permet d'identifier la gouvernance et les indicateurs environnementaux mis en place pour assurer le suivi des effets du PCAET.

Dans le cadre de la rédaction des fiches-actions, le PCAET identifie d'ores-et-déjà des indicateurs de suivi, en lien avec les objectifs stratégiques du document. Certains de ces indicateurs peuvent également servir au suivi environnemental des actions, et permettre lors de l'évaluation à mi-parcours puis à 6 ans, de dresser un bilan des impacts environnementaux de la mise en œuvre du PCAET. C'est particulièrement le cas pour les actions en lien avec la vulnérabilité du territoire.

L'outil de suivi est présenté dans un fichier à part. Les indicateurs sont reportés sur les fiches-actions.

		Suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme d'actions															
Axe	Action	Impact attendu sur les thématiques du PCAET						Indicateur de suivi	Unité	Suivi des indicateurs							
		Atteint	Partiel	Non atteint	Non applicable	Non applicable	Non applicable			Etat initial (si connu) / actions déjà mises en place	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aménagement & Construction	1. Poursuivre la montée en puissance du Programme Local de l'Habitat (PLH)	x	x					Nombre de logements rénovés avec un label de performance énergétique de classe A/B/C/D/E Etat des lieux des DPE de logements Nombre de logements accompagnés par l'Agence Climat France Habitat - EOPH - Mission de l'habitat Part de la population en logement de type DPE énergétique dégradé									
	2. Accompagner l'implémentation des collectivités à travers la poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur Intercommunal et Energétique (SDIE)	x	x					Bilan DPE des bâtiments publics Part de parc immobilier des collectivités locales classé Connaissance géographique du parc immobilier des collectivités locales									
	3. Accompagner et sensibiliser la société énergétique et aux modes constructifs alternatifs	x	x					Nombre de logements rénovés avec un dispositif de performance énergétique (EOPH) Etat des lieux des DPE de logements Nombre de logements accompagnés par la mission de l'habitat Formation de l'Éco-citoyen Habitat Taux de recensement des habitants âgés à la relation professionnelle de service des clients Nombre d'opérations de maintenance de la qualité d'un bâtiment et la toiture									

Figure 1. Extrait de l'outil de suivi  
Source : ALTEREA

Cette grille de suivi poursuivra ainsi un double objectif :

- Suivre les indicateurs de moyens et de résultats quant à la mise en œuvre du PCAET
- Suivre les impacts environnementaux de la mise en œuvre du PCAET.

## 2.2 Le dispositif de suivi de la mise en œuvre PCAET

Le suivi environnemental sera complété par :

- Un tableau de bord permettant de suivre de façon globale la mise en œuvre du plan d'action du PCAET ainsi que les indicateurs « macro » à l'échelle du territoire. Cette vision synthétique permet de suivre les tendances et trajectoires en matière de consommation énergétique, de production d'énergie renouvelable, d'émission de GES, de séquestration carbone.
- Une grille de suivi de la mise en œuvre des actions, organisée par thématique. Ce suivi permettra de rendre compte de l'avancement de la mise en œuvre des actions en termes de moyens humains et financiers déployés et de résultats obtenus.

Enfin, REDON Agglomération étudiera l'opportunité de suivre son plan d'action au travers d'une plateforme dédiée (par exemple la plateforme mise à disposition des territoires par l'ADEME).

## 3. L'animation du plan d'actions

Par ailleurs, REDON Agglomération entend mettre en place plusieurs instances pour assurer le suivi du PCAET.

- Une organisation inter-services pour assurer la transversalité

Des référents « climat » seront désignés au sein de chaque service pour s'assurer de la mise en œuvre des actions, étant précisé ici que la démarche de transition fait d'ores et déjà partie intégrante du projet de territoire et est déjà portée au titre de chaque compétence de l'intercommunalité.

Des réunions semestrielles seront organisées pour suivre la mise en œuvre des actions, faire état des avancements, des difficultés et du suivi des indicateurs de moyens.

L'enjeu sera de poursuivre des échanges bilatéraux entre le chargé de mission PCAET et chaque service mais aussi de pérenniser la démarche de transversalité inter-services engagée.

- Un lien renforcé avec les communes








Le lien avec les communes sera assuré par la volonté, au titre du plan d'action, de désigner un élu référent PCAET dans chaque commune. Le lien avec les services communaux sera poursuivi au travers des réunions DGS, organisés une fois par ans. Par ailleurs des échanges semestriels avec les communes dites « centralités » (Allaire, Pipriac, Guémené-Penfao et Plessé) permettront également de faire le lien entre les projets portés par les communes et les objectifs du PCAET.

- Un comité de suivi

Enfin, un comité de suivi sera constitué, dans la continuité du comité de pilotage. Il se réunira 3 à 4 fois par ans pour faire le point sur l'avancement des actions et soulever les points d'arbitrage et de priorisation. Il permettra de dresser, annuellement, le bilan des actions engagées.


# PCAET REDON AGGLOMERATION

## Avancement du Plan d'action

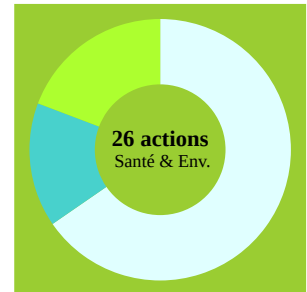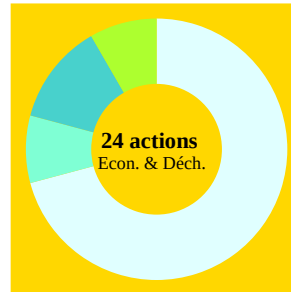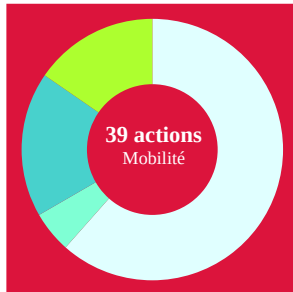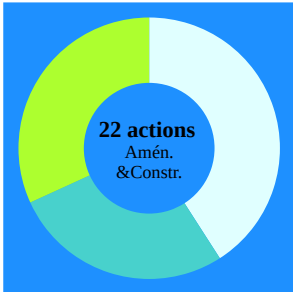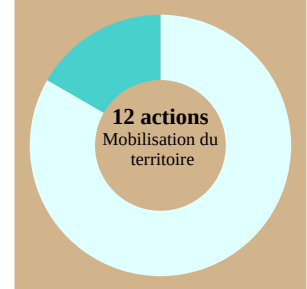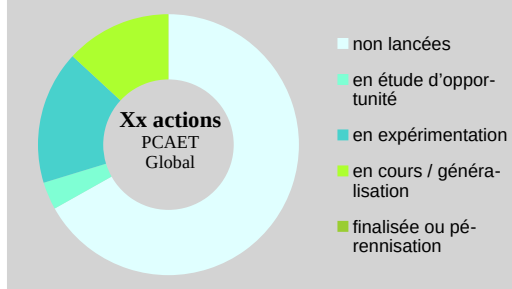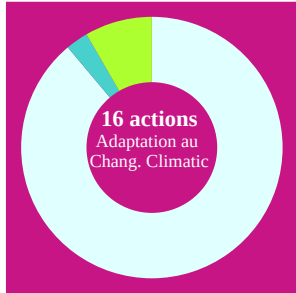


## Indicateurs Climat globaux


Réduction des émissions de Gaz à effet de serre




Réduction de la consommation d'énergie finale



Part d'énergie primaire consommée PRODUITE sur le territoire




Courbe d'évolution des production d'EnR par filière

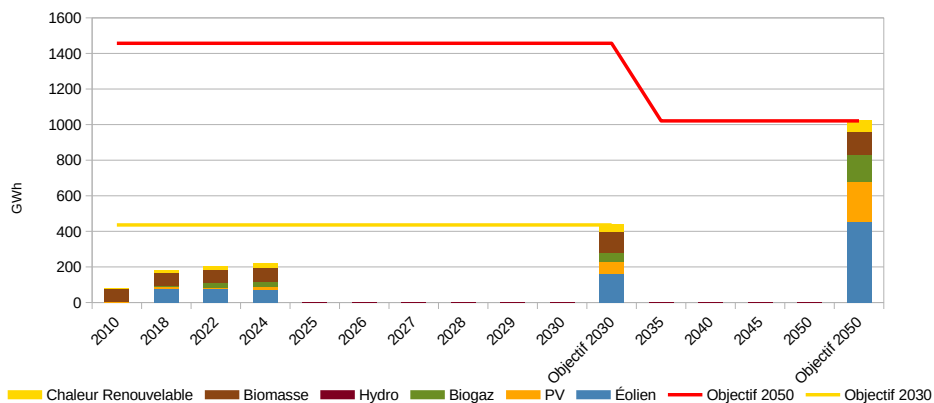


## Indicateurs Climats par Secteurs

Atteintes des Objectifs réduction des émissions de GES par secteur d'activité / augmentation capacité de séquestration carbone

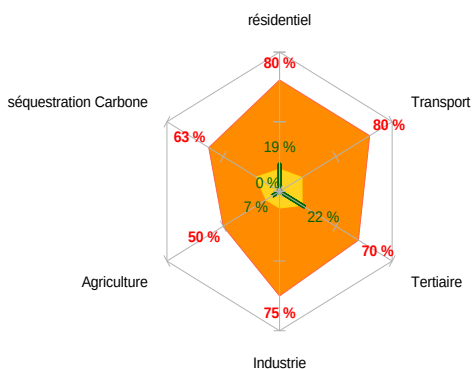

Atteintes des Objectifs réduction des consommations d'énergies par secteur d'activité

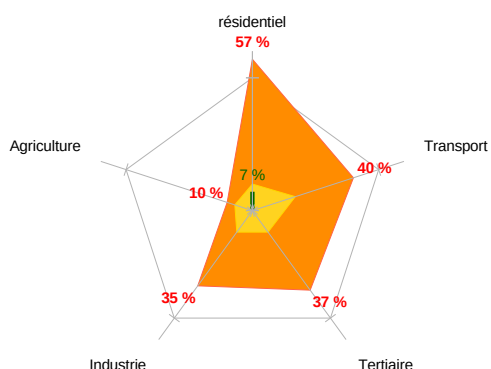

## Evolution de la Trajectoire Climatique sur le territoire

Ajout d'un indicateur sur l'évolution de la température moyenne annuelle depuis 50 ans

Ajout d'un indicateur sur l'évolution du nombre de jours/nuits canicules depuis 50 ans

Ajout d'un indicateur sur les crues (amplitude / fréquence) à Redon

Axe	Action	Projets	Impact attendu sur les thématiques du PCAET							Indicateur de suivi	Méthode	Unité	Suivi des indicateurs								
			Atténuation		Séquestration	Adaptation au changement climatique	Production d'énergie renouvelable et de récupération	Lutte contre la précarité énergétique	Qualité de l'air				Etat initial (si connu) / actions déjà mises en place	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			Consommations énergétiques	Emissions de gaz à effet de serre																	
Aménagement & Construction	1. Poursuivre la montée en puissance du Programme Local de l'Habitat (PLH)									Nombre de logements rénovés avec un niveau de performance énergétique de classe C ou mieux	Enquête déclarative sur demandes probables de travaux										
											Etat des lieux des DPE du territoire	3- Synthèse des DPE de nouveaux logements et de vente et de location de logements existants									
												Nombre de logements accompagnés par l'Agence Conseil France Rénov' - ECRF	Enquête déclarative sur demandes probables de travaux								
												Part de la population en situation de précarité énergétique logement	Statistiques France Rénov' / Ma Prime Rénov'								
	2. Accompagner l'émancipation des collectivités à travers la poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur Immobilier et Énergétique (SDIE)											SDIE des communes									
												Part de parc immobilier des collectivités locales rénové	Données Service Aménagement								
												Consommation énergétique du parc immobilier des collectivités locales	Données Service Aménagement								
												Nombre de logements rénovés avec un objectif de performance énergétique D	Enquête déclarative sur demandes probables de travaux								
												Etat des lieux des DPE du territoire	vente et de location de logements existants								
	3. Accompagner et sensibiliser à la sobriété énergétique et aux modes constructifs alternatifs											Nombre de logements accompagnés par le maître de l'habitat	Statistiques France Rénov' / Ma Prime Rénov'								
												Préparation de l'investissement immobilier	Données Mairie de l'habitat								
												Taux de respect des habitats légers à une isolation satisfaisante de grande classe	De plus en plus, sur le site préconstruit de l'axe des zones d'habitat								
												Nombre d'opérations de sensibilisation sur la qualité d'air intérieur et le Platan									
	4. Proposer des leviers financiers facilitants											Nombre de primes complémentaires versées	Données internes RA + communes								
												Nombre de leviers fiscaux effectués	Données internes RA + communes								
												Montant des leviers fiscaux perçus	Données internes RA + communes								
												Nombre de dossiers soumis par des tiers investisseurs	Identifier les tiers investisseurs, demander un partage des données								
												Evolution du bilan DPE du territoire	Terminé OER + TED								
5. Utiliser le levier de la réglementation pour changer les habitudes de construction											Inscription au PLU des nouvelles contraintes réglementaires oui / non	Service Urbanisme									
											Nombre d'habitations équipées d'un système de récupération d'eau	Enquête grand public									
											Nombre d'habitations légers ou de petite taille	Service Urbanisme									
											Nombre de logements sensibilisés aux économies d'énergie et d'eau	Données Service Aménagement en charge des actions de sensibilisation									
												Consommation d'énergie	Application ZAN								
Mobilité	1. Renforcer les réseaux structurants pour un maillage adapté et connecté via la stratégie de Mobilités de RA										Taux de fréquentation des pistes d'écovélo	Indicateur ZAN									
												Enquête de satisfaction des usagers / des usagers	Enquête								
												Ratio dépenses engagées / usagers réels	Données RA								
												Nombre de voyageurs sur les réseaux de transport (par bus, covoiturage...)	Données Opérateur de transport + enquête utilisateur pour Covoiturage								
												Sauv du nombre de stationnements vélos	Enquête auprès des communes								
	2. Renforcer les réseaux de proximité pour une desserte de l'ensemble des habitants de RA											Ann d'itinéraires cyclables	Enquête auprès des communes								
												Unités des vélos de location avec un accompagnement adapté à la circulation des différents modes de mobilité	Enquête auprès des communes								
												% de vélos conformes à la réglementation	Enquête auprès des communes								
												Part modale du vélo	Enquête annuelle grand public (Institut Gous)								
												Part modale des transports en commun	Enquête annuelle grand public (Institut Gous)								
	3. Proposer des services de mobilité pour l'ensemble des habitants de RA											Nombre d'actions en faveur des territoires écologiques	Service Urbanisme								
												Consommation d'énergie	Application ZAN								
												Sauv de l'articulation fil aux infrastructures de mobilité	Indicateur ZAN								
												Nombre d'ADP engageant un vélo-matériel durable	Données Communes et RA								
												Nombre de démarches accompagnées	Enquête auprès des communes (et des études préliminaires et définitives)								
	4. Accompagner au changement de pratiques via le plan de Mobilités de RA											Nombre de véhicules électriques immatriculés dans les communes	Données Communes et services Mobilité RA								
												Nombre de communes équipées par un PAVE (Plan de Mise en Accessibilité de l'axe des transports publics)	Enquête auprès des communes								
												Nombre de communes équipées par un PAVE (Plan de Mise en Accessibilité de l'axe des transports publics)	Enquête auprès des communes								
												Nombre de nouvelles ventes aux particuliers aux abords des écoles	Audit externe ou service Mobilité RA								
												Recensement des équipements de qualité en véhicule individuel	Enquête grand public								
5. Etudier l'opportunité de transports de marchandises alternatifs et de logistique urbaine optimisée											Nombre moyen de véhicules par ménage	Enquête grand public									
											Sauv de l'articulation fil aux infrastructures de mobilité	Service Urbanisme RA									
											Nombre de bornes de recharge	Enquête Collective									
											Sauv des services de mobilité partagée : mise en œuvre et fréquentation par usagers	Bilan des services de mobilité partagée identifiés									
											Nombre de voyageurs sur le réseau RCO	Service Mobilité RA									
6. Accompagner les synergies du territoire pour accompagner les flux de marchandises											Part modale du vélo	Service Mobilité RA									
											Part modale des transports en commun	Service Mobilité RA									
											Nombre moyen de véhicules par ménage	Service Mobilité RA									
											Part de la population totale / employée	Service RA									
											Part de la population en situation de précarité énergétique résidentielle	Enquête grand public									
Economie & Déchets	1. Favoriser les synergies entre entreprises en faveur de l'optimisation des ressources										Nombre d'entreprises engagées dans une politique mobilité	Enquête auprès des entreprises									
												Nombre d'élèves formés à « savoir faire à vélo »	Enquête auprès des écoles								
												Nombre de PCE (Plan Déplacement Établissement Scolaire)	Communes ou Enquête + Audit								
												Nombre de véhicules intermédiaires écologiques sur le territoire	Enquête grand public								
												Préparation des transports en commun	Données Service Mobilité								
	2. Acculturer les entreprises aux enjeux climatiques											Réduction de l'usage des véhicules par des usagers bénéficiaires du forfait mobilité durable	Enquête auprès des personnes bénéficiaires du forfait mobilité durable								
												Part modale du vélo	Service RA								
												Chiffres personnels	Données Service Mobilité								
												Catégorie des opportunités	Service Mobilité RA								
												Part des entreprises sensibilisées à la logistique urbaine durable	Recensement des formations effectuées								
	3. Lier le Schéma d'Accueil des Entreprises à leur impact social et environnemental											Part des entreprises ayant opté des transformations dans leur logistique de dépôt de	Enquête auprès des entreprises								
												Volume de marchandises transportées par des modes à faible émission	Enquête auprès des entreprises / et des transporteurs								
												Part du transport de marchandises sur le territoire réalisé par des modes à faible émission	Enquête auprès des entreprises / et des transporteurs								
												Part des entreprises ayant opté des transformations dans leur logistique de dépôt de	Enquête auprès des entreprises								
												Nombre d'entreprises / commerces sensibilisés aux déchets	Audat externe ou service Mobilité RA								
	4. Inscrite dans le projet de territoire la volonté de tendre vers un territoire « 0-déchets » via la mise en œuvre du PLPOMA											Part des entreprises qui appliquent une prime à l'écovélo	Enquête auprès des entreprises de transport								
												Nombre de communes ayant des actions de sensibilisation de transport logistique avec d'autres communes	Enquête auprès des communes								
												Estimation du nombre de km évités	Analyse sur la base des résultats des enquêtes								
												Part des chauffeurs de transport motorisé du territoire à l'écovélo	Service RA								
												Part modale du vélo	Service RA								
5. Optimiser la gestion des résidus végétaux											Part des entreprises couvertes par une démarche ET nombre total de zones	Service Dev ECO									
											Nombre de recommandations organisées par an	Service Dev Eco ou prestataire ET									
											Taux de matières dérivées / réutilisées	Enquête Entreprise									
											Nombre de déchets recyclés réutilisés	Enquête Entreprise									
											Nombre de bâtiments économes énergétiques	Enquête Entreprise									
6. Favoriser le développement de l'économie circulaire											Montant des ventes des entreprises sensibilisées en zone de proximité	Big et communes + enquête entreprise (si auto-régulé - 2024, 2025)									
											Nombre d'entreprises sensibilisées	Enquête Entreprise									
											Nombre de déchets évités	Enquête Entreprise									
											Nombre de freins de charbon évités	Enquête Entreprise									
											Nombre de freins de charbon évités	Enquête Entreprise									
7. Permettre l'accélération des changements de pratiques agricoles en garantissant l'équilibre entre préservation des ressources et viabilité économique											Nombre de freins de charbon évités	Enquête Entreprise									
											Taux de satisfaction des entreprises impliquées	Enquête Entreprise									
											Evolution de l'adoption de la carte (ou une enquête auprès des entreprises de RA)	Enquête Dev									
											% des 23 communes par un cadre des déchets environnementaux	Service Dev ECO									
											Nombre d'entreprises certifiées dans le cadre de la mise en œuvre du cadre des déchets	Service Urbanisme									
1. Assurer la sécurité alimentaire et l'accès à une alimentation saine, y compris aux populations en situation de précarité (à travers la mise en œuvre du PAAT)											Nombre d'entreprises / acteurs du territoire adoptant un service de covoiturage	Service Dev Eco - Enquête entreprises									
											Nombre d'animations de niveau de la campagne	Service Dev Eco - Enquête entreprises									
											% de citoyens ayant connaissance du réseau de covoiturage	Enquête grand public									
											Volume de déchets par logement	Service Déchet									
											Différenciation de la comptabilité des végétaux (oui / non)	Service RA - Service Déchet									
2. Préserver la ressource en eau											Nombre de communes équipées de bornes de recharge										





Axe	Mobilité
-----	----------

Evaluation avancement des actions	Non démarré	Etude d'opportunité	Expérimentation	En cours / généralisation	Finalisé ou pérennisé
Nombre de sous action	24	2	7	6	0

Actions :	Sous-actions	Résultats attendus	Rôle RA	Service Pilote	Services associés	Acteurs Pilotes	Acteurs Associés	Public Cible	Calendrier Objectif	date mise à jour	Avancement	Statut (blanc = non démarré / jaune = en cours / rouge = en retard / vert = achevé)	Budget Alloué				
													2025	2026	2027	2028	2029
1. Renforcer les réseaux structurants pour un maillage adapté et connecté via la stratégie de Mobilités de RA	1.1 Construire un réseau structurant de transports en commun sur REDON Agglomération (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	En cours / généralisation						
	1.2 Construire un réseau intercommunal cyclable structurant (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	1.3 Construire un réseau de covoiturage structurant (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Partenaire	Service Mobilité							Dec-2025	Non démarré					
	1.4 Renforcer l'intermodalité et la multimodalité (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)			Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Etude d'opportunité					
	1.5 Réaliser un entretien annuel des aménagements pour les mobilités Douces			Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré					
	1.6 Faciliter la cohabitation entre les différents modes de mobilités en adaptant par exemple les règles de circulation			Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré					
	1.7 Assurer la continuité des mobilités douces en intégrant dans le PLU, pour les nouveaux aménagements, une voirie suffisante pour les pistes cyclables et les cheminements piétons			Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré					
2. Renforcer les réseaux de proximité pour une desserte de l'ensemble des habitants via la stratégie de Mobilités de RA	2.1 Intégrer la mobilité dans les documents de planification de REDON Agglomération		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	En cours / généralisation						
	2.2 Croiser les politiques de développement résidentiel, d'emploi et de services avec celles des mobilités (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Etude d'opportunité						
	2.3 Engager des réflexions sur la place de la voiture dans les centralités (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	2.4 Accélérer le développement des aménagements cyclables et piétons dans les centralités (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglo.)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	En cours / généralisation						
	2.5 Mettre en place systématiquement un schéma des mobilités scolaires par les communes à l'échelle des écoles : soutenir les pédibus, sensibiliser les écoles, rendre plus confortables les aménagements piétons.		Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	2.6 Améliorer les aménagements aux abords des lycées et collèges pour sécuriser et privilégier les mobilités actives pour les déplacements des enfants et favoriser un environnement plus sain		Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	2.7 Promouvoir l'usage d'applications facilitant la multimodalité sur le territoire		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
3. Proposer des services de mobilité pour l'ensemble des habitants de REDON Agglomération via la stratégie de Mobilités de RA	3.1 Améliorer la qualité de service des transports scolaires (accessibilité, sécurité, coût...) (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglo.)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	3.2 Déployer de nouveaux services de transport en commun (billettique 250 ke d'investissement puis 50 ke de fonctionnement) (fiche action 20 de la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	3.3 Déployer des offres de service de mobilités partagées (VAE longue durée, vélo en libre service, autopartage) (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	3.4 Analyser le bilan du coût d'exploitation au regard de la tarification après plusieurs années d'expérience et, en conséquence, analyser l'opportunité de la gratuité des transports en commun		Pilote	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	3.5 Soutenir les structures en faveur des publics empêchés ou éloignés		Pilote/ Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	En cours / généralisation						
	3.6 Poursuivre le développement des bornes de recharge (en 2020, 2 % des véhicules immatriculés en Bretagne sont électriques) (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	En cours / généralisation						
4. Accompagner au changement de pratiques via le plan de Mobilités de RA	4.1 Mener des actions de mobilités auprès des publics prioritaires (écoles, entreprises, agents) (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglo.)		Pilote/ Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	En cours / généralisation						
	4.2 Améliorer la communication et l'information auprès des voyageurs (communication + création d'une maison des mobilités) (inscrit dans la stratégie mobilités de REDON Agglomération)		Pilote/ Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	4.3 Créer un fonds de soutien aux projets locaux sur les mobilités		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	4.4 Accompagner le changement des modes de vie vers les mobilités actives (inscrite au Contrat Local de Santé 2)		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	4.5 Promouvoir le développement des véhicules intermédiaires		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	4.6 Expérimenter, sur un panel de ménages volontaires, une aide financière pour encourager les mobilités alternatives		Pilote/ Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	4.7 Promouvoir la généralisation du forfait mobilité durable par les employeurs		Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	4.8 Identifier les entreprises et établissements scolaires qui ont des horaires de travail communs afin de rationaliser les transports. éventuellement dans un deuxième temps, travailler à l'homogénéisation des horaires de travail d'entreprises voisines		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
5. Étudier l'opportunité de transports de marchandises alternatifs et de logistique urbaine optimisée	5.1 Développer une stratégie de logistique urbaine durable : faire un diagnostic et identifier des leviers d'actions		Pilote/ Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	5.2 Mettre en place un service de cocarionnage adapté aux enjeux identifiés		Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	5.3 Développer le transport de marchandises en train adapté aux enjeux identifiés		Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	5.4 Développer le transport de marchandises par voies fluviales adapté aux enjeux identifiés		Partenaire/ Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	5.5 Optimiser le dernier kilomètre pour les livraisons : dernier km en vélo léger ou en mobilité douce		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
6. Accompagner les synergies du territoire pour accompagner les flux de marchandises	5.6 Identifier toutes les entreprises de transport de marchandises du territoire et les inciter à travailler en synergie		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Expérimentation						
	6.1 Sensibiliser à la livraison plus écologique / plus « lente »		Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	6.2 Labelliser les entreprises et commerçants qui se font livrer par des transports plus vertueux		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	6.3 Soutenir les transporteurs dans la formation à l'écoconduite et inciter les entreprises à récompenser les bonnes pratiques à travers des primes		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
	6.4 Mutualiser des besoins de livraison pour les collectivités (ex : livraison des cantines scolaires, des repas à domicile, etc)		Observateur	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré						
6.5 Mettre en place un service d'accompagnement des communes mutualisé pour mettre en œuvre leur propre schéma de mobilité (Conseiller en Mobilité Partagée - CMP)		Partenaire	Service Mobilité						Dec-2025	Non démarré							

Axe	Economie & Déchets
-----	--------------------

Evaluation avancement des actions	Non démarré	Etude d'opportunité	Expérimentation	En cours / généralisation	Finalisé ou pérennisé
Nombre de sous action	17	2	3	2	0

Actions :	Sous-actions	Résultats attendus	Porteurs et partenaires							Budget Alloué									
			Rôle RA	Service Pilote	Services associés	Acteurs Pilotes	Acteurs Associés	Public Cible	Calendrier Objectif	date mise à jour	Avancement	Statut (blanc = non démarré / jaune = en cours / rouge = en retard / vert = achevé)	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Favoriser les synergies entre entreprises en faveur de l'optimisation des ressources	1.1 Généraliser et pérenniser les démarches d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) : - favoriser les synergies entre entreprises en organisant des temps d'échange réguliers, en déployant la démarche sur l'ensemble des zones d'activités et auprès de tous types d'acteurs économiques ; - encourager une dynamique d'émulation positive entre entreprises ; - s'appuyer sur les dirigeants moteurs pour faire émerger des coopérations ; - mutualiser des compétences, des services et des savoir-faire ; - favoriser les échanges de ressources et le réemploi		Partenaire	chargé de mission EIT							Dec-2025	Expérimentation							
	1.2 Créer les conditions de la mutualisation de ressources : faire appel à une charge de mission ou un bureau d'étude pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments des entreprises (sur le modèle des Conseillers en Énergie Partagés - CEP)		Partenaire	chargé de mission EIT								Dec-2025	Non démarré						
	1.3 Accompagner les acteurs économiques (toutes filières confondues) à l'accélération de la transition écologique : conseil, mise en réseau, appui à la recherche de financements, stimuler les innovations....		Pilote	chargé de mission EIT								Dec-2025	Non démarré						
	1.4 Encourager et accompagner les entreprises particulièrement consommatrices, à la réduction de leur consommation et l'amélioration de sa qualité en sortie (eau grise)		Pilote	chargé de mission EIT								Dec-2025	Non démarré						
2. Acculturer les entreprises aux enjeux climatiques	2.2 Conditionner tout soutien public (accès au foncier, soutien financier, soutien politique) à des engagements concrets en faveur de la transition (ex : réalisation obligatoire d'un bilan carbone, fresque du climat...) pour tous les acteurs économiques (entreprises, commerces, industries, agriculteurs)		Partenaire	Pôle DTE - direction Economie							Dec-2025	Non démarré							
	2.1 Soutenir et intensifier les dispositifs locaux d'accompagnement des entreprises dans les enjeux d'adaptation et d'atténuation du changement climatique		Partenaire	Pôle DTE - direction Economie								Dec-2025	Non démarré						
3. Lier le Schéma d'Accueil des Entreprises à leur impact social et environnemental	3.1 Doter le territoire d'une charte aux critères environnementaux et sociaux afin de définir quelles entreprises le territoire souhaite accueillir en priorité		Pilote	Service Economie							Dec-2025	Non démarré							
	3.2 Conditionner systématiquement l'implantation d'entreprises dans les zones d'activités (ZA) au respect des objectifs du PCAET via la mise en œuvre d'un cahier des charges précisant les exigences environnementales (usage de matériaux biosourcés dans les bâtiments, gestion des ressources, eau et énergie, participer aux mutualisations, etc)		Pilote/Partenaire/Observateur	Service Economie								Dec-2025	Non démarré						
4. Inscrire dans le projet de territoire la volonté de tendre vers un territoire « 0-déchets » via la mise en œuvre du PLPDMA	4.1 Renforcer le PLPDMA existant avec la mise en place de la consigne des emballages auprès d'un maximum de commerçants. Impliquer les producteurs de produits locaux. Porter à connaissance, communiquer et s'engager sur une charte		Pilote	Service Déchet							Dec-2025	Non démarré							
	4.2 Animer un réseau de la consigne		Pilote	Service Déchet							Dec-2025	Non démarré							
	4.3 Développer un réseau « VRAC » en incitant les commerçants à le valoriser, les entreprises à adhérer et sensibiliser le grand public		Pilote	Service Déchet								Dec-2025	Non démarré						
	4.4 Poursuivre les mécanismes incitatifs ou contraignants pour obliger les acteurs du territoire (privés et particuliers) à mieux gérer leur déchets ménagers (y compris les déchets recyclables)		Pilote	Service Déchet								Dec-2025	En cours / généralisation						
5. Optimiser la gestion des résidus végétaux	5.1 Sensibiliser à l'usage des résidus végétaux dans les jardins publics et particuliers : faire prendre conscience que ce n'est pas un « déchet » mais une ressource (ex : haies sèches) à travers des ateliers et événements		Partenaire/Observateur	Service Déchet							Dec-2025	En cours / généralisation							
	5.2 Généraliser l'utilisation de techniques alternatives à tous les usagers (broyeurs, mulching, compostage)		Partenaire/Observateur	Service Déchet							Dec-2025	Expérimentation							
	5.3 Réfléchir à des mécanismes incitatifs ou contraignants pour obliger les acteurs du territoire (privés et particuliers) à mieux gérer leur résidus végétaux (ex : haies sèches)		Pilote	Service Déchet								Dec-2025	Expérimentation						
	5.4 Proposer de différencier la comptabilité des résidus végétaux et des déchets ménagers afin que le tonnage des résidus végétaux ne pénalise pas les performances globales de réduction des déchets		Pilote	Service Déchet								Dec-2025	Non démarré						
6. Favoriser le développement de l'économie circulaire	6.1 Soutenir l'économie de la fonctionnalité (location, réparation, services partagés), en accompagnant les structures ou en incitant les clients		Pilote	Service Economie							Dec-2025	Non démarré							
	6.2 Référencer tous les bâtiments inoccupés pouvant accueillir une activité économique et réaliser un diagnostic des travaux pour orienter les nouvelles installations		Pilote	Service Economie								Dec-2025	Non démarré						
	6.3 Identifier des mécanismes de soutien au développement des structures de réemploi		Pilote	Service Economie								Dec-2025	Non démarré						
7. Permettre l'accélération des changements de pratiques agricoles en garantissant l'équilibre entre préservation des ressources et viabilité économique	7.1 Élaborer une stratégie foncière d'acquisition qui permettrait le maintien des exploitations en agriculture biologique et d'inciter des exploitants à s'installer en agriculture extensive		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation							Dec-2025	Etude d'opportunité							
	7.2 Créer un GFA* territorial financé par les acteurs économiques et citoyens afin de sécuriser du foncier, dont l'exploitation sera conditionnée à des critères environnementaux		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré						
	7.3 Créer les conditions pour un territoire 50 % de Surface Agricole Utile (SAU) en agriculture biologique à horizon 2050 : - proposer un accompagnement financier pour trouver des débouchés pour les producteurs (au-delà de l'agglomération) - favoriser la consommation locale - mettre en place une charte territoriale pour une agriculture résiliente (= PAAT) - répondre à l'appel à projet de la Région Bretagne "territoire d'expérimentation 0 phyto 2040"		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Etude d'opportunité						
	7.4 Mettre en place systématiquement des baux ruraux à clauses environnementales sur le foncier agricole détenu par les collectivités		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré						
	7.5 Étudier l'opportunité de mettre en place un dispositif de rémunération des services rendus à la nature (biodiversité, stockage carbone, préservation des ressources, etc) - exemple dispositif PSE		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré						

Axe	Santé & environnement
-----	-----------------------

Evaluation avancement des actions	Non démarré	Etude d'opportunité	Expérimentation	En cours / généralisation	Finalisé ou pérennisé
Nombre de sous action	17	0	4	5	0

Actions :	Sous-actions	Résultats attendus	Porteurs et partenaires							Budget Alloué									
			Rôle RA	Service Pilote	Services associés	Acteurs Pilotes	Acteurs Associés	Public Cible	Calendrier Objectif	date mise à jour	Avancement	Statut (blanc = non démarré / rose = en cours / rouge = en retard / vert = achevé)	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Assurer la sécurité alimentaire et l'accès à une alimentation saine, y compris aux populations en situation de précarité (à travers la mise en œuvre du PAAT)	1.1 Continuer l'accompagnement des restaurants collectifs pour renforcer les approvisionnements en produits locaux et bio (ou autre signe d'identification de la qualité d'origine (SIQO), en lien avec les objectifs de la loi EGalim (prévoit 50% d'approvisionnements sous signe de qualité, dont 20 % de bio)		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation							Dec-2025	En cours / généralisation							
	1.2 Expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation (SSA) sur la base du volontariat en s'appuyant entre autres sur les associations locales. A initier par exemple à travers la mise en place de paniers bio pour les femmes enceintes avec une prise en charge partielle		Pilote/Partenaire	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré						
	1.3 Créer une centrale d'achats pour les cantines du territoire		Pilote/Partenaire	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Expérimentation						
	1.4 Promouvoir la nutrition, l'alimentation durable, la sécurité alimentaire, la santé-environnement, la biodiversité et l'activité physique (par exemple à travers les jardins partagés) (inscrite au CLS et au PAAT)		Pilote/Partenaire	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré						
	1.5 Développer un programme de sensibilisation à l'alimentation durable pour les scolaires (primaires) prenant en compte les enjeux de nutrition (inscrite au CLS et au PAAT)		Pilote/Partenaire	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré						
	1.6 Mettre en place et animer un réseau des cuisiniers et un réseau pause méridienne avec une attention sur le gaspillage alimentaire		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Expérimentation						
2. Préserver la ressource en eau	2.1 Sécuriser la protection des captages d'eau par l'acquisition foncière publique et la mise en place de baux environnementaux pour une gestion agricole respectueuse de la ressource		Pilote	Service Eau et Assain.							Dec-2025	Non démarré							
	2.2 Réaliser et mettre en œuvre le schéma d'assainissement		Partenaire	Service Eau et Assain.							Dec-2025	En cours / généralisation							
	2.3 Mettre en place la réutilisation des eaux traitées des stations d'épuration là où c'est pertinent (STEP)		Pilote	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
	2.4 Accompagner les changements de pratiques à travers : - des actions de sensibilisations scolaires et grand public - la formation continue des acteurs en charge de la gestion de la ressource (distributeurs et traitements EU) - la mutualisation d'achat de cuves de stockage d'eau de pluie - l'encouragement à la réutilisation des eaux de pluie à travers les documents d'urbanisme (voir action 5.4 du volet Aménagement & Construction)		Pilote/Partenaire	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
	2.5 Faire évoluer la tarification progressive de l'eau plus contraignante (avec prise en compte du nombre d'occupants par foyer)		Partenaire/Observateur	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
	2.6 Mettre en place une gouvernance multi-partenaire décloisonnée autour des enjeux agricoles et de la qualité de l'eau		Pilote	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
	2.7 Consolider et amplifier le renouvellement des anciennes conduites d'eau potable pour lutter contre les fuites (objectif linéaire /an x 1,5)		Pilote/Partenaire/Observateur	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
3. Désimperméabiliser et re-végétaliser	3.1 Réalisation du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales		Pilote	Service Eau et Assain.							Dec-2025	En cours / généralisation							
	3.2 Désimperméabiliser massivement les sols : cartographier le gisement des sols et désimperméabiliser les sols des zones publiques.		Pilote	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
	3.3 Intégrer dans le PLUI un coefficient de végétalisation pour tout nouvel aménagement		Pilote	Service Eau et Assain.								Dec-2025	En cours / généralisation						
	3.4 Réfléchir systématiquement aux opportunités de réaménagement durables (désimperméabilisation, modification des mobilités, végétalisation, etc.) lors de travaux sur l'espace public (y compris sur les réseaux)		Pilote/Partenaire	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré						
	3.5 Planter des haies et retaluter à l'échelle des parcelles (Voir fiche action 11 du SDEnR)		Partenaire	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Expérimentation						
5. Favoriser la séquestration de carbone par les puits de carbone naturels et dans les pratiques agricoles	4.1 Poursuivre l'inventaire et la mise à jour des zones humides et les inscrire dans le PLUI conformément au SAGE Vilaine.		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	En cours / généralisation							
	4.2 Planter des forêts ou encourager la renaturation sur les parcelles de déprise agricole / impropres à la culture, afin de séquestrer du carbone		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré						
	4.3 Identifier les forêts communales du territoire et proposer un mode de gestion/entretien à l'échelle du territoire (instauration d'un cahier des charges pour la gestion des forêts - maintien de la gestion communale)		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré						
	4.4 Développer les prairies permanentes		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré						
	4.5 Favoriser les pratiques agricoles vertueuses, encourager les pratiques permettant la hausse des taux de matières organiques des sols et interdire celles qui les réduisent		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré						
6. Promouvoir des milieux et des cadres de vie favorables à la santé au travers notamment du Contrat Local de Santé	5.1 Réfléchir à impulser le développement d'une dynamique d'accompagnement long terme sur la prise en compte d'un urbanisme favorable à la santé (s'inspirer de l'action du CLS 2 (Contrat Local de Santé) qui s'est traduite par la mise en place de conférences favorables à la santé)		Partenaire	Pôle Santé							Dec-2025	Non démarré							
	5.2 Promouvoir la qualité de l'air intérieur, avec une focalité particulière sur la prévention des risques liés au radon (inscrite au CLS 2)		Partenaire	Pôle Santé								Dec-2025	Expérimentation						
	5.3 Identifier et mettre en place des actions pour réduire les déchets médicamenteux domestiques (inscrite au CLS 2)		Partenaire	Pôle Santé								Dec-2025	Non démarré						

Axe	Énergie
-----	---------

Evaluation avancement des actions	Non démarré	Etude d'opportunité	Expérimentation	En cours / généralisation	Finalisé ou pérennisé
Nombre de sous action	8	2	6	0	0

Actions :	Sous-actions	Résultats attendus	Porteurs et partenaires							Budget Alloué									
			Rôle RA	Service Pilote	Services associés	Acteurs Pilotes	Acteurs Associés	Public Cible		Calendrier Objectif	date mise à jour	Avancement	Statut (blanc = non démarré / jaune = en cours / rouge = en retard / vert = achevé)	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Acculturer, conseiller, former, accompagner les acteurs locaux	1.1 Créer un service d'accompagnement aux collectivités auprès des développeurs de projets privés		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré							
	1.2 Élaborer des chartes par filière		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré							
	1.3 Renforcer l'agence locale de l'habitat - information & acculturation des particuliers		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Expérimentation							
	1.4 Soutenir la filière de formation professionnelle des métiers EnR		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré							
	1.5 Missionner des CEP pour accélérer la transition énergétique des équipements publics		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré							
	1.6 Organiser l'acculturation des élus et des acteurs locaux		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Expérimentation							
2. Organiser l'implication du territoire dans les grands projets de production d'EnR	2.1 Structurer l'investissement du territoire dans les grands projets		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Etude d'opportunité							
	2.2 Définir une stratégie foncière		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Expérimentation							
	2.3 Développer et Piloter de grands projets stratégiques (éolien, PV sol)		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Expérimentation							
3. Soutenir et développer la filière bois-énergie et les réseaux de chaleur	3.1 Protéger le gisement bois existant (PLUi)		Pilote								Dec-2025	Non démarré							
	3.2 Développer le gisement de haies bocagères		Observateur								Dec-2025	Expérimentation							
	3.3 Structurer les acteurs de la filière		Partenaire								Dec-2025	Expérimentation							
	3.4 Mettre en œuvre des projets structurants de réseaux de chaleur mutualisés		Partenaire								Dec-2025	Etude d'opportunité							
4. Massifier les projets de petites et moyennes tailles	4.1 Organiser la mutualisation du portage de projets photovoltaïques de taille moyenne		Partenaire/Observateur								Dec-2025	Non démarré							
	4.2 Soutenir la mise en place de l'autoconsommation collective (via des gouvernances territoriales)		Partenaire/Observateur								Dec-2025	Non démarré							
	4.3 Etudier la possibilité d'activer les leviers réglementaires et financiers		Pilote								Dec-2025	Non démarré							

Axe	Adaptation au changement climatique
-----	-------------------------------------

Evaluation avancement des actions	Non démarré	Etude d'opportunité	Expérimentation	En cours / généralisation	Finalisé ou pérennisé
Nombre de sous action	32	0	1	3	0

Actions :	Sous-actions	Résultats attendus	Rôle RA	Service Pilote	Porteurs et partenaires					Calendrier Objectif	date mise à jour	Avancement	Statut dans le tableau : non démarré / en cours / risque non retard / vert / orange	Budget Alloué						
					Services associés	Acteurs Pilotes	Acteurs Associés	Public Cible						2025	2026	2027	2028	2029		
1. Favoriser les îlots de fraîcheur en privilégiant des espèces locales	1.1 Maintenir les îlots de fraîcheur existants et inciter au développement de nouveaux îlots de fraîcheur sur les projets de construction / aménagements. Puis à moyen terme, imposer par des moyens contraignants (par exemple via les orientations d'aménagement et de programmation - OAP).		Pilote	Service Aménagement							Dec-2025	Non démarré								
	1.2 Réaliser un diagnostic complet des lieux recevant du public vulnérable (écoles, hôpitaux...) pour s'assurer de la présence d'îlots de fraîcheur		Observateur	Service Aménagement								Dec-2025	Non démarré							
	1.3 Créer des parcs/places végétalisés plus denses et planter des arbres dans les centralités		Pilote/Partenaire	Service Aménagement								Dec-2025	Non démarré							
	1.4 Soutenir et favoriser les plantations de vergers dans les centralités		Pilote/Partenaire	Service Aménagement								Dec-2025	Non démarré							
	1.5 Favoriser la réappropriation des espaces publics par les habitants en proposant des espaces de repos, de proximité, conviviaux, ombragés et accessibles à tous		Pilote/Partenaire	Service Aménagement								Dec-2025	Non démarré							
2. Anticiper les pénuries d'eau	2.1 Encourager puis inciter à des systèmes hydro-économiques dans les foyers		Partenaire	Service Eau et Assain.							Dec-2025	Non démarré								
	2.2 Améliorer la gestion de l'eau : hiérarchiser les besoins d'eau en cas d'extrême nécessité (au travers du PCS) → prioriser certaines cultures agricoles sur d'autres - décliner le cadre réglementaire national du guide sécheresse à l'échelle locale de manière plus précise		Pilote/Partenaire	Service Eau et Assain.								Dec-2025	Non démarré							
	2.3 Proposer une modification du suivi de la consommation d'eau potable par les concessionnaires pour avoir une vision des consommations totales à l'échelle de chaque commune		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	2.4 Expérimenter l'usage des eaux de pluie et des eaux grises dans les bâtiments publics pour les usages non alimentaires (WC, nettoyage...)		Pilote	Pôle Patrimoine et Infrastructures								Dec-2025	Non démarré							
3. Anticiper le risque d'incendie	3.1 Améliorer la connaissance des espaces sensibles aux incendies (ex : terrain abandonnés...) afin de connaître et localiser les risques, puis établir un plan d'action en s'appuyant sur les préfectures et les syndicats		Partenaire/ Observateur									Dec-2025	Non démarré							
	3.2 Mettre en œuvre les préconisations des Services Départementaux d'Incendie et de Secours dont les Obligations Légales de Débroussaillage (OLD)		Observateur									Dec-2025	Non démarré							
4. Protéger les populations des conséquences du changement climatique	4.1 Assurer la sécurité alimentaire des populations en accompagnant l'adaptation des pratiques agricoles aux changements climatiques (culture et élevage)		Observateur	Pôle Agriculture et Alimentation							Dec-2025	Non démarré								
	4.2 Engager une réflexion sur l'organisation de stocks stratégiques au travers de la production locale (via le PAAI) pour mieux anticiper les risques de rupture d'approvisionnement		Pilote	Pôle Agriculture et Alimentation								Dec-2025	Non démarré							
	4.3 Mettre en place des lieux de repli climatisés dans les communes pour les personnes les plus fragiles en cas de forte chaleur		Observateur	Pôle Santé								Dec-2025	Non démarré							
	4.4 Accentuer le travail mis en place par les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les coopérations de proximité de repérage des personnes isolées (accentuer la mise en place des registres existants afin d'identifier les personnes vulnérables en cas de forte chaleur)		Partenaire	Pôle Santé								Dec-2025	Expérimentation							
	4.5 Adapter les horaires de travail et scolaires en cas de forte chaleur		Observateur	Pôle Santé								Dec-2025	Non démarré							
	4.6 Accentuer les lieux et les occasions de partage autour des bonnes conduites à tenir en cas d'événements climatiques extrêmes (action CLS2)		Pilote/Partenaire	Pôle Santé								Dec-2025	Non démarré							
	4.7 Documenter les impacts du changement climatique sur la santé mentale des habitants du territoire et proposer des actions d'accompagnement		Partenaire/ Observateur	Pôle Santé								Dec-2025	Non démarré							
5. Adapter nos dispositifs de soin aux conséquences du changement climatique	5.1 S'assurer de la capacité du secteur médical (notamment stockage de médicaments) à résister aux vagues de chaleur		Observateur	Pôle Santé							Dec-2025	Non démarré								
	5.2 Mettre en place/accueillir des protocoles de repérage et de limitation de propagation du moustique tigre et autres vecteurs de nouvelles maladies identifiées par les services sanitaires (REDON Agglomération est partenaire sur la diffusion d'information) (action du CLS 2)		Partenaire	Pôle Santé								Dec-2025	En cours / généralisation							
	5.3 Identifier la vulnérabilité d'accès aux dispositifs médicaux en cas de crise (incendie, inondation, tempête...) - adapter les Plans Communaux / Intercommunaux de sauvegarde (PCS / PICS)		Pilote/Partenaire	Pôle Santé								Dec-2025	Non démarré							
6. Améliorer notre adaptation au risque d'inondation	6.1 Intégrer à la révision du PPRI des scénarios basés sur les prévisions scientifiques et mettre à jour le PLUI en intégrant ces nouveaux scénarios		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré								
	6.2 Définir des zones non constructibles autour des cours d'eau suffisamment larges pour assurer la protection des populations et le flux d'écoulement des eaux (mise en œuvre du SAGE et du PPRI dans le PLUI)		Pilote/Partenaire/ Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	En cours / généralisation							
	6.3 Intégrer, par des OAP (orientations d'aménagement et de programmation), la résilience au risque inondation dans le PLUI		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	6.4 Redonner des espaces de mobilité aux cours d'eau		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	6.5 Améliorer les connaissances sur le ruissellement, puis les traduire dans les documents territoriaux (PLUI et Plan Communal de Sauvegarde)		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	6.6 Protéger la qualité de l'eau en cas de crise : - réaliser un diagnostic complet sur les zones inondables (PPRI mis à jour) des pollutions potentielles associées, afin d'identifier les vulnérabilités du territoire - établir un plan d'action en conséquence		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
7. Étudier la vulnérabilité des voiries et réseaux	7.1 Étudier la vulnérabilité de tous les réseaux (assainissement, gaz, eau...) aux risques naturels (incendie, inondation, sécheresse) → découpler les réseaux en cas de présence d'un habitat / commerce inondable dans la zone		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré								
	7.2 Axes routiers et ferroviaires : - étudier la vulnérabilité vis à vis des risques retraits et gonflement d'argile / incendie / inondation - établir un plan d'action en conséquence		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
8. Préserver et accompagner l'adaptation de la biodiversité	8.1 Poursuivre la réalisation des atlas de la biodiversité et leur intégration dans les documents d'urbanisme		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	En cours / généralisation								
	8.2 Adapter la gestion des espaces verts aux effets du changement climatique		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré								
9. Acculturer et sensibiliser aux risques du dérèglement climatique	9.1 Acculturer : accompagner les habitants sur la compréhension des risques climatiques et les enjeux d'adaptation		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré								
	9.2 Sensibiliser en particulier aux risques de retrait et gonflement d'argile - recommandations à introduire dans le PLUI (voir obligatoire)		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	9.3 Approfondir les connaissances sur les risques de tempêtes / vagues de froid		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	9.4 Mise en place d'un budget d'accompagnement à l'adaptation au changement climatique (équipe ressources humaines dédiée, communication et sensibilisation)		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							
	9.5 Sensibiliser les habitants et les agents des collectivités à la gestion publics pour préserver la biodiversité		Pilote/Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités								Dec-2025	Non démarré							

Axe	<b>Mobilisation</b>
-----	---------------------

Evaluation avancement des actions	Non démarré	Etude d'opportunités	Expérimentation	En cours / généralisation	Finalisé ou pérennisé
Nombre de sous action	10	0	2	0	0

Actions :	Sous-actions	Résultats attendus	Porteurs et partenaires							Budget Alloué								
			Rôle RA	Service Pilote	Services associés	Acteurs Pilotes	Acteurs Associés	Public Cible		Calendrier Objectif	date mise à jour	Avancement	Statut (blanc = non démarré / jaune = en cours / Rouge = en retard / vert = achevé)	2025	2026	2027	2028	2029
1. Mobiliser les leviers de la collectivité pour impliquer le territoire	1.1 Mobiliser des moyens humains à la hauteur des objectifs pour accompagner durablement les changements de pratiques, en misant sur la sensibilisation par l'action (ex : jardins pédagogiques, chantiers participatifs pour restaurer les cours d'eau, etc).		Pilote/ Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
	1.2 Généraliser et augmenter les exigences environnementales des appels d'offres publics afin d'encourager les entreprises à des pratiques plus vertueuses		Pilote/ Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
2. Soutenir les initiatives citoyennes	2.1 Augmenter le budget citoyen pour des propositions en faveur du climat		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Expérimentation						
	2.2 Massifier et généraliser les ateliers Repair Café, qui pourraient être étendus (ex : garage associatifs pour voitures, machines de jardin..)		Partenaire/ Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Expérimentation						
	2.3 Encourager la création d'associations de plantation de vergers via des aides financières		Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
	2.4 Mettre en place un Groupement Forestier Citoyen et Écologique		Partenaire/ Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
	2.5 Favoriser l'appropriation de la végétalisation des espaces publics par les habitants et acteurs du territoire		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
3. Impliquer les élus dans la mobilisation du territoire	3.1 Sensibiliser les élus, habitants, agents territoriaux, etc. aux enjeux globaux du réchauffement climatique et à leurs effets à l'échelle locale		Pilote/ Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
	3.2 Incarner le PCAET, ses enjeux, ses objectifs par la mise en place d'une grande fête afin de mobiliser, intéresser, rassembler les acteurs du territoire. Veiller à l'implication de l'ensemble des communes		Pilote/ Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
	3.3 Avoir un élu référent PCAET par commune		Partenaire	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
4. Accueillir des initiatives innovantes pour faciliter l'implication du territoire	4.1 Étudier la possibilité de travailler les équilibres entre les métropoles et les territoires ruraux sur le modèle de services rendus à l'environnement (ex : les métropoles pourraient participer au financement des transports décarbonés des campagnes)		Pilote	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
	4.2 Encourager la polyactivité, en faveur des actions sociétales bénéfiques (ex : ½ jour par semaine à consacrer à la production agricole avec en contrepartie la fourniture de produits frais)		Partenaire/ Observateur	Pôle Transition Ecologiques Et Centralités							Dec-2025	Non démarré						
